
## Niveau 4

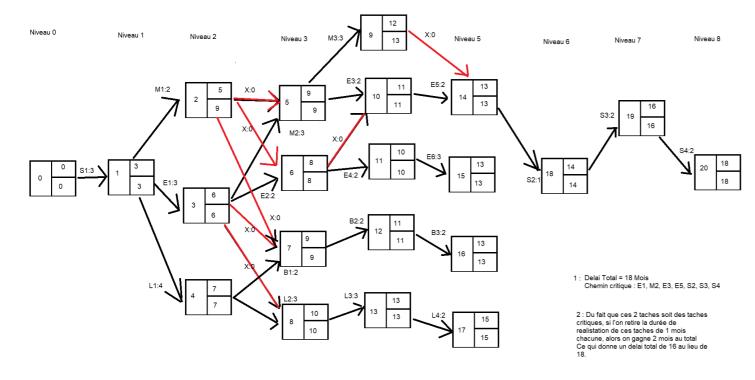

N°	Tâche	Durée (mois)	Condition de démarrage de la tâche
S	Système		tache
S1	Conception du système	3	Lancement du projet
52	Montage du câblage	1	M3: E5
53	Intégration des matériaux	2	S2:E6:03
54	Intégration des solutions logicielles	2	S3 ;44
М	Mécanique		
M1	Conception de la mécanique	2	S1-
M2	Dessin de la mécanique	3	M1;E1
M3	Réalisation de la mécanique	3	M2
E	Électronique		
E1	Étude de la partie électronique	3	51-
E2	Implantation des cartes subordonnées	2	M1;E1
E3	Implantation des cartes principales	2	M2;E2
E4	Réalisation des cartes subordonnées	2	<del>12-</del>
E5	Réalisation des cartes principales	2	63-
E6	Tests des cartes subordonnées	3	-E4
L	Logiciel		
L1	Conception générale du logiciel	4	SF
L2	Conception détaillée du logiciel	3	E1;L1
L3	Développement du logiciel	3	12.
L4	Tests du logiciel	2	13.
В	Banc d'intégration		
B1	Étude du banc d'intégration	2	M1;E1;E1
B2	Réalisation du banc	2	81
В3	d'intégration  Mise au point du banc d'intégration	2	82

Niveau 1:S1

Niveau 2 : M1, E1, L1

Niveau 3 : M2, E2, L2, B1 Niveau 4: M3, E3, E4, L3, B2

Niveau 5 : E5, E6, L4, B3

Niveau 6 : S2

Niveau 7 · S3

Niveau 8 : S4
